

# Bod č.

## Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

Materiál na rokovanie Zastupiteľstva  
Bratislavského samosprávneho kraja  
20. február 2015

### Plnenie Akčného plánu

**Úradu Bratislavského samosprávneho kraja pre implementáciu Programu  
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na  
roky 2014-2020**

---

Materiál predkladá:

Ing. Martin Berta, CSc.  
podpredseda Bratislavského  
samosprávneho kraja

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa
3. Stanoviská komisií
4. Príloha č. 1
5. Príloha č. 2

Zodpovedná:

Mgr. Barbora Lukáčová  
riaditeľka odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Spracovatelia:

Mgr. Martin Hakel, BA  
vedúci oddelenia stratégie a územného rozvoja

Ing. Michal Beniač  
vedúci oddelenia riadenia projektov

Ing. Martin Bezek  
referent oddelenia stratégie a územného rozvoja

Mgr. Zuzana Hradská Lacková  
referentka oddelenia stratégie a územného rozvoja

Bratislava  
Február 2015

## N á v r h u z n e s e n i a

### **UZNESENIE č. .... / 2015** zo dňa 20.02.2015

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

#### **A . s c h v a ľ u j e**

**A . 1 :** Odpočet Akčného plánu Úradu BSK pre implementáciu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014-2020 (ďalej len Odpočet Akčného plánu BSK), za kalendárny rok 2014.

**A . 2 :** Aktualizáciu Akčného plánu Úradu BSK pre implementáciu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014-2020 (ďalej len Aktualizácia Akčného plánu BSK) pre kalendárny rok 2015.

#### **B . u k l a d á**

riaditeľovi úradu Bratislavského samosprávneho kraja:

Predkladať Zastupiteľstvu BSK odpočet Akčného plánu BSK za predchádzajúci kalendárny rok a aktualizáciu Akčného plánu BSK pre príslušný kalendárny rok pravidelne raz za rok najneskôr v termíne ku 31. marcu daného kalendárneho roka.

## Dôvodová správa

Bratislavský samosprávny kraj za účelom podpory regionálneho rozvoja podľa zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja spracoval strednodobý strategický dokument Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja BSK na roky 2014-2020 (ďalej len **PHSR BSK 2014-2020**), ktorý bol schválený Zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho kraja dňa 21.6.2013.

Pre implementáciu programovej časti PHSR BSK 2014-2020 bol spracovaný a schválený v podobe prílohy **Akčný plán Úradu BSK 2014-2015** pre implementáciu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014-2020. Z práce so schváleným akčným plánom Zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho kraja dňa 21.6.2013 vystala potreba **zvýšiť dôraz na proces prípravy projektov a naviazania procesu prípravy na programový rozpočet Úradu Bratislavského samosprávneho kraja**.

Z tohto dôvodu bolo doplnených respektíve upravených v pôvodnom Akčnom pláne Úradu BSK 2014-2015 niekoľko častí umožňujúcich úspešnú implementáciu projektov a operatívne plnenie stratégie PHSR BSK 2014-2020 do formy nového materiálu: Akčný plán Úradu Bratislavského samosprávneho kraja pre implementáciu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014-2020 (ďalej len **Akčný plán BSK**), schváleného Zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho kraja 21.02.2014 Uznesením č. 10/2014.

V súlade s Uznesením č. 10/2014 Úrad Bratislavského samosprávneho kraja spracoval komplexný materiál s názvom **Plnenie Akčného plánu Úradu Bratislavského samosprávneho kraja pre implementáciu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014-2020** obsahujúci Odpočet Akčného plánu BSK za kalendárny rok 2014 a aktualizovaný Akčný plán BSK pre kalendárny rok 2015.

### **Odpočet Akčného plánu BSK za kalendárny rok 2014**

Rozhodujúcim faktorom úspešnosti realizácie projektu (najmä z Európskych štrukturálnych a investičných fondov) je miera pripravenosti jednotlivých projektov. Vychádza predovšetkým zo schopnosti Úradu BSK efektívne pracovať na komplexných problémoch a výzvach, ktorým Bratislavský samosprávny kraj čelí. Odpočet Akčného plánu BSK za kalendárny rok 2014 sa zameriava na plnenie jednotlivých kľúčových krokov priradených k jednotlivým projektom úradu. Kľúčový krok implementácie predstavuje čiastkové činnosti jednotlivých odborov a oddelení Úradu BSK, ktoré je potrebné vykonať pre úspešnú realizáciu projektov.

V roku 2014 Úrad BSK splnil, respektíve priebežne plnil 108 kľúčových krokov implementácie z celkového počtu 191. Počet nesplnených kľúčových krokov implementácie za rok 2014 dosiahlo hodnotu 54. Vzájomná prepojenosť jednotlivých krokov vytvára požiadavku pre hlbšiu spoluprácu. Zároveň je Úrad BSK schopný reagovať v prípade nedokonalého plnenia kľúčových krokov a iniciovať zlepšenie fungovania. **System následne vytvára priestor pri nesplnených kľúčových krokoch na doplnenie nového termínu.** V prípade všetkých priebežne plnených a nesplnených kľúčových krokov implementácie je uvedené vysvetlenie dôvodu zmeny termínu. Zároveň boli doplnené viaceré odbory a oddelenia do časti zodpovednosti z dôvodu potreby efektívnejšej spolupráce.


### Stav plnenia klúčových krokov implementácie Akčného plánu BSK k 31.12.2014

Nositeľ projektu	Projekt		Klúčové kroky implementácie				
	počet	zrušené projekty	splnených / priebežne plnených	nesplnených	zrušených	nepotrebných	spolu
OSV	10	1	12	5	5	0	22
OKaP	7	0	3	17	1	0	21
OÚPGISaŽP	3	0	6	1	0	0	7
OZ	2	0	6	1	2	0	7
OD	6	2	10	0	11	0	21
OŠMaŠ	8	0	19	4	4	3	30
OCRaK	10	0	9	16	0	1	26
OSÚRaRP	19	0	45	10	0	0	55
úrad celkovo	65	3	110	54	23	4	191

### Grafické zobrazenie plnenia klúčových krokov



## Rozdelenie splnených kľúčových krokov plnenia Akčného plánu BSK za rok 2014

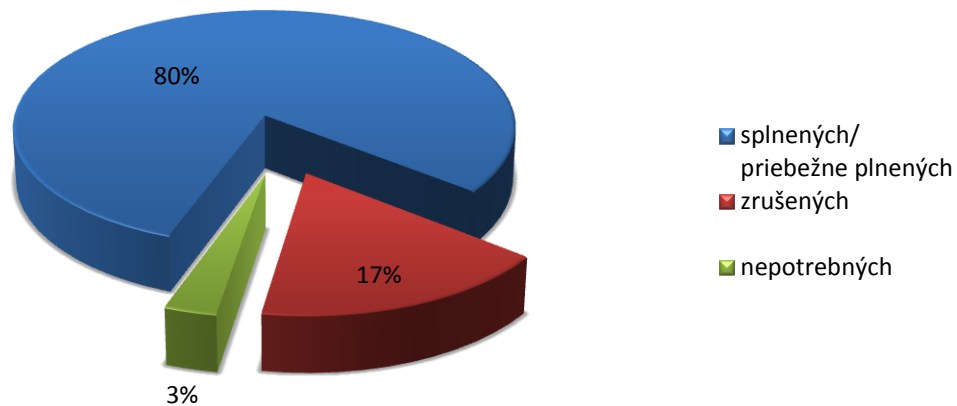

Použité skratky: OSV – Odbor sociálnych vecí, OKaP – Odbor komunikácia a propagácie, OÚPGISaŽP – Odbor územného plánu, GIS a životného prostredia, OZ - Odbor zdravotníctva, OD – Odbor dopravy, OŠMaŠ – Odbor školstva, mládeže a športu, OCRaK – Odbor cestovného ruchu a kultúry, OSÚRaRP – Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

### Aktualizácia Akčného plánu BSK pre kalendárny rok 2015

Materiál obsahuje projekty odborov Úradu BSK ako aj nové kľúčové kroky implementácie, ktoré je nevyhnutné plniť v roku 2015 s výhľadom do roku 2016. Aktualizácia Akčného plánu BSK pre kalendárny rok 2015 je predovšetkým živým dokumentom, ktorý je výsledkom neustáleho formovania a zvyšovania informačnej hodnoty v procese plánovania. Zároveň však stanovuje jasné smerovanie rozvojových zámerov Úradu BSK prostredníctvom projektov jednotlivých odborov.

**Zmeny a doplnenia Akčného plánu BSK nastali najmä v časti kľúčové kroky implementácie, ktorá obsahuje:** D.1 určuje kľúčové kroky implementácie - projektového cyklu (je to zároveň nositeľ informácie miery rozpracovania projektu), ktoré je potrebné realizovať; D.2 informuje o plánovanej hodnote výdavkov pre realizáciu krokov (pozn. v prípade, že je hodnota nula, krok nebude realizovaný externým subjektom); D.3 určuje zodpovednú organizačnú zložku úradu, ktorá má vykonávať kľúčový krok; D.4 hovorí o umiestnení alokácie finančných prostriedkov v rozpočte Úradu BSK podľa programov; D.5 informuje o plánovanom termíne plnenia

### Nepotrebné kľúčové kroky

V rámci **Odboru školstva, mládeže a športu** je definovaných 8 projektov, pričom k identifikácii nepotrebných krokov došlo v prípade 3 projektov.

**Projekt č.31 Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy v pekárstve a cukrárstve a v mäsiarstve a lahôdkarstve, Farského 9, Bratislava**

Kľúčový krok E: Vysporiadanie majetkovoprávných vzťahov COVP

Zodpovedný: **PO/OIČSMaVO /SM**

Termín plnenia: 02/15

Dôvod: Na základe analýzy nie je potrebné realizovať vysporiadanie majetkovoprávných vzťahov

### **Projekt č.32 Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy agropodnikaní - farmárstve, v chove koní a jazdeckve, v kynológii a v rybárstve, SNP 30, Ivanka pri Dunaji**

Kľúčový krok G: Vysporiadanie majetkovoprávných vzťahov COVP

Zodpovedný: **PO/OIČSMaVO /SM**

Termín plnenia: 02/15

Dôvod: Na základe analýzy nie je potrebné realizovať vysporiadanie majetkovoprávných vzťahov

### **Projekt č.33 Vytvorenie a rekonštrukcia strednej odbornej školy Ivanská cesta 21 na Centrum odborného vzdelávania a prípravy v stavebníctve**

Kľúčový krok F: Vysporiadanie majetkovoprávných vzťahov COVP

Zodpovedný: **PO/OIČSMaVO /SM**

Termín plnenia: 02/15

Dôvod: Na základe analýzy nie je potrebné realizovať vysporiadanie majetkovoprávných vzťahov

V rámci **Odboru cestovného ruchu a kultúry** je definovaných 10 projektov, pričom k identifikácii nepotrebných krokov došlo v prípade 1 projektu.

### **Projekt č.46 Rekonštrukcia kaštieľa a parku v Malinove**

Kľúčový krok C: Verejné obstarávanie realizácie sanácie strechy

Zodpovedný: **OIČSMaVO/OVO**

Termín plnenia: 04/14

Dôvod: Neexistuje spracovaná projektová dokumentácia rekonštrukcie

## **Zrušené kľúčové kroky**

V rámci **Odboru sociálnych vecí** je definovaných 9 projektov, pričom k zrušeniu kľúčových krokov došlo v prípade 2 projektov.

### **Projekt č.3 Investičná podpora zariadení sociálnych služieb na Hontianskej 12 a 16**

Kľúčový krok B: Spracovanie projektovej dokumentácie pre zateplenie Hontianskej 12

Zodpovedný: **OIČSMaVO/OIČ**

Termín plnenia: 12/14

Dôvod: Investičný zámer si nevyžaduje spracovanie projektovej dokumentácie

Kľúčový krok C: Spracovanie projektovej dokumentácie pre zateplenie Hontianskej 14

Zodpovedný: **OIČSMaVO/OIČ**

Termín plnenia: 12/14

Dôvod: Investičný zámer si nevyžaduje spracovanie projektovej dokumentácie

Kľúčový krok D: Verejné obstarávanie pre výber zhotoviteľa PD a inštalácie výťahu  
Zodpovedný: **OIČSMaVO/OVO**  
Termín plnenia: 06/15  
Dôvod: Kľúčový krok bol zrušený z dôvodu zrušenia predošlých kľúčových krokov B a C

### **Projekt č.7 Hodnotenie kvality sociálnych služieb v kompetencii BSK a monitorovanie ich plnenia**

Kľúčový krok A: Vyhodnotenie zariadení sociálnych služieb podľa nových štandardov kvality

Zodpovedný: **OSV**  
Termín plnenia: priebežne  
Dôvod: Metodika hodnotenia kvality poskytovanej sociálnej služby nebola doposiaľ zo strany MPSVR SR zverejnená. Kompetenciu hodnotiť kvalitu poskytovanej sociálnej služby má podľa zákona o sociálnych službách výlučne Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR).

Kľúčový krok B: Zverejnenie kvalitatívneho zoznamu  
Zodpovedný: **OSV**  
Termín plnenia: priebežne  
Dôvod: Metodika hodnotenia kvality poskytovanej sociálnej služby nebola doposiaľ zo strany MPSVR SR zverejnená. Kompetenciu hodnotiť kvalitu poskytovanej sociálnej služby má podľa zákona o sociálnych službách výlučne Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR)

V rámci **Odboru cestovného ruchu a kultúry** je definovaných 10 projektov, pričom k identifikácii nepotrebných krokov došlo v prípade 1 projektu.

#### **Projekt č.15 Projekt Piknik&Bike (II. Fáza)**

Kľúčový krok C: Realizácia a promo P&B Medická záhrada  
Zodpovedný: **OKaP**  
Termín plnenia: 06/14  
Dôvod: Pripravené 26.4.2014, ale kvôli počasiu muselo byť zrušené

V rámci **Odboru zdravotníctva** sú definované 3 projektov, pričom k zrušeniu kľúčových krokov došlo v prípade 1 projektu.

#### **Projekt č.23 Kooperácia na rozširovaní a zachovaní LSPP a ústavnej pohotovostnej služby v regióne Záhorie vo verejnom záujme**

Kľúčový krok A: Príprava VZN  
Zodpovedný: **OZ**  
Termín plnenia: 12/14  
Dôvod: VZN nebolo pripravované z dôvodu, že po právnej analýze bolo vyhodnotené, že podpora môže byť uskutočnená v rámci súčasného VZN BSK č. 6/2012 o poskytovaní dotácií.

Kľúčový krok B: Schválenie VZN ZBSK a jeho implementácia  
Zodpovedný: **OZ**  
Termín plnenia: 12/14  
Dôvod: VZN nebolo pripravované z dôvodu, že po právnej analýze bolo vyhodnotené, že podpora môže byť uskutočnená v rámci súčasného VZN BSK č. 6/2012 o poskytovaní dotácií.

V rámci **Odboru dopravy** je definovaných 6 projektov, pričom k zrušeniu kľúčových krokov došlo v prípade 3 projektov

### **Projekt č.25 Vybudovanie obchvatu Pezinok – Modra**

Kľúčový krok B: Overenie a aktualizácia správnosti dokumentácie pre územné rozhodnutie a aktualizácia

Zodpovedný: **OD**

Termín plnenia: 12/14

Dôvod: Zrušenie z dôvodu zmeny časovej a technickej nadväznosti jednotlivých krokov

Kľúčový krok C: Technická štúdia pre naplánovanie rasovania obchvatu

Zodpovedný: **OD**

Termín plnenia: 2015

Dôvod: Zrušenie z dôvodu zmeny časovej a technickej nadväznosti jednotlivých krokov

Kľúčový krok E: Spracovanie podkladov pre územné rozhodnutie

Zodpovedný: **OD**

Termín plnenia: 2015

Dôvod: Zrušenie z dôvodu zmeny časovej a technickej nadväznosti jednotlivých krokov

Kľúčový krok F: Výber spracovateľa EIA

Zodpovedný: **OD**

Termín plnenia: 2015

Dôvod: Zrušenie z dôvodu zmeny časovej a technickej nadväznosti jednotlivých krokov

Kľúčový krok G: Príprava dokumentácie pre stavebné povolenie

Zodpovedný: **OD**

Termín plnenia: 09/15

Dôvod: Zrušenie z dôvodu zmeny časovej a technickej nadväznosti jednotlivých krokov

Kľúčový krok H: Obstaranie tendrovej dokumentácie

Zodpovedný: **OD**

Termín plnenia: 09/15

Dôvod: Zrušenie z dôvodu zmeny časovej a technickej nadväznosti jednotlivých krokov

Kľúčový krok I: Začatie VO pre dodávateľa stavby

Zodpovedný: **OD**

Termín plnenia: 12/15

Dôvod: Zrušenie z dôvodu zmeny časovej a technickej nadväznosti jednotlivých krokov

Kľúčový krok J: Realizácia stavby

Zodpovedný: **OD**

Termín plnenia: 01/16

Dôvod: Zrušenie z dôvodu zmeny časovej a technickej nadväznosti jednotlivých krokov

### **Projekt č.26 Obmedzovanie tranzitu ťažkej nákladnej dopravy**



Kľúčový krok A: Vyhodnotenie vstupných údajov získaných z NDS o pohybe nákladnej dopravy po cestách II. a III. triedy

Zodpovedný: **OD**

Termín plnenia: 12/14

Dôvod: Nevhodnosť podkladov, ktoré poskytla NDS, ktoré nebolo možné použiť pre vymedzenie úsekov so zákazom pohybu vozidiel ťažších ako 12 ton

### **Projekt č.27 Zriadenie cyklotrás vo vojenskom obvode Záhorie a v Malých Karpatoch**

Kľúčový krok A: Verejné obstarávanie zhotoviteľa projektovej dokumentácie aj s analýzou majetkovoprávných vzťahov k pozemkom

Zodpovedný: **OIČSMaVO/OVO**

Termín plnenia: 06/14

Kľúčový krok B: Realizácia vysporiadania pozemkov a značenia

Zodpovedný: **OD**

Termín plnenia: 12/14

Dôvod: Plánované cyklotrasy cez Vojenský obvod Záhorie sa nerealizovali z dôvodu, že Ministerstvo obrany SR si vyčlenilo hodiny na cvičenia a streľby v danom území, a pre občanov by jazda na bicykli bola v danom vojenskom priestore životu nebezpečná

V rámci **Odboru školstva, mládeže a športu** je definovaných 8 projektov, pričom k zrušeniu kľúčových krokov došlo v prípade 4 projektov

### **Projekt č. 30. Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií, Hlinícka 1, Bratislava**

Kľúčový krok E: Projektová dokumentácia

Zodpovedný: **OIČSMaVO/OIČ**

Termín plnenia: 06/15

Dôvod: Zrušené z dôvodu zmeny časovej a technickej nadväznosti jednotlivých krokov

### **Projekt č. 31. Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy v pekárstve a cukrárstve a v mäsiarstve a lahôdkarstve, Farského 9, Bratislava**

Kľúčový krok E: Projektová dokumentácia

Zodpovedný: **OIČSMaVO/OIČ**

Termín plnenia: 06/15

Dôvod: Zrušené z dôvodu zmeny časovej a technickej nadväznosti jednotlivých krokov

### **Projekt č. 32. Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy agropodnikaní - farmárstve, v chove koní a jazdecke, v kynológii a v rybárstve, SNP 30, Ivanka pri Dunaji**

Kľúčový krok E: Projektová dokumentácia

Zodpovedný: **OIČSMaVO/OIČ**

Termín plnenia: 06/15

Dôvod: Zrušené z dôvodu zmeny časovej a technickej nadväznosti jednotlivých krokov

### **Projekt č. 33. Vytvorenie a rekonštrukcia strednej odbornej školy Ivanská cesta 21 na Centrum odborného vzdelávania a prípravy v stavebníctve**

Kľúčový krok F: Projektová dokumentácia

Zodpovedný: **OIČSMaVO/OIČ**

Termín plnenia: 06/15

Dôvod: Zrušené z dôvodu zmeny časovej a technickej nadväznosti jednotlivých krokov

## Nesplnené kľúčové kroky

V rámci **Odboru sociálnych vecí** je definovaných 9 projektov, pričom k nesplneniu kľúčových krokov došlo v prípade 4 projektov.

### Projekt č. 2 Bezpečný ženský dom

Kľúčový krok C: Mzdové náklady (koordinátor projektu, fin. manažér)

Zodpovedný: **OSÚRaRP**

Termín plnenia: 12/14

Dôvod: Vzhľadom k zdĺhavému hodnoteniu žiadosti o NFP došlo k posunu všetkých následných krokov

Kľúčový krok D: Informovanie a publicita

Zodpovedný: **OKaP**

Termín plnenia: 06/14

Dôvod: Vzhľadom k zdĺhavému hodnoteniu žiadosti o NFP došlo k posunu všetkých následných krokov

### Projekt č. 3 Investičná podpora zariadení sociálnych služieb na Hontianskej 12 a 16

Kľúčový krok A: Projektový zámer pre debarierizáciu zariadenia na Hontianskej 12

Zodpovedný: **OSV**

Termín plnenia: 05/14

Dôvod: OSV navrhuje úlohu presunúť na rok 2015 a zaradiť do zoznamu budov na zníženie energetickej náročnosti

### Projekt č. 4 Deinštitucionalizácia a transformácia DSS Stupava

Kľúčový krok B: Spracovanie projektového zámeru DlaT DSS Stupava

Zodpovedný: **OSV/OIČSMaVO/OIČ/SM/OSÚRaRP**

Termín plnenia: 12/14

Dôvod: Projekt pravdepodobne nebude realizovaný v rámci IROP 2014 – 2020, nakoľko toho času známe podmienky programu neumožňujú BSK garantovať dostatočnú uskutočniteľnosť projektu a dlhodobú udržateľnosť transformovaných služieb.

### Projekt č.8 Podpora spolupráce a siet'ovania poskytovateľov sociálnych služieb poskytovaných v kompetencii obcí a BSK

Kľúčový krok A: Spracovanie koncepcie spolupráce samosprávy

Zodpovedný: **OSV**

Termín plnenia: 12/14

Dôvod: OSV pripravuje Koncepciu rozvoja sociálnych služieb v kompetencii BSK na roky 2015 – 2019 a na jej príprave plánuje spolupracovať s obcami BSK. Vzhľadom na túto skutočnosť OSV navrhuje spracovanie koncepcie takejto spolupráce presunúť na rok 2015

V rámci **Odboru komunikácie a propagácie** je definovaných 7 projektov, pričom k nesplneniu kľúčových krokov došlo v prípade 7 projektov.

## **Projekt č.11 Implementácia korporátnej identity BSK**

Kľúčový krok A: Spustenie multimediálnych aplikácií: proe.biz

Zodpovedný: **OKaP**

Termín plnenia: 03/14

Dôvod: Projekt pozastavený z dôvodu neukončeného schvaľovacieho procesu

Kľúčový krok B: Merkantilné tlačoviny: proe.biz

Zodpovedný: **OKaP**

Termín plnenia: 06/14

Dôvod: Krok B bude realizovaný po realizácii kroku A

Kľúčový krok C: Prezentačné materiály (roll-up, brožúry): proe.biz

Zodpovedný: **OKaP**

Termín plnenia: 06/14

Dôvod: Krok C bude realizovaný po realizácii kroku B

Kľúčový krok D: Reklamné predmety: proe.biz

Zodpovedný: **OKaP**

Termín plnenia: 06/14

Dôvod: Krok D bude realizovaný po realizácii kroku C

Kľúčový krok E: Spustenie info systému (interiér/exteriér): proe.biz

Zodpovedný: **OKaP**

Termín plnenia: 09/14

Dôvod: Krok E bude realizovaný po realizácii kroku D

Kľúčový krok F: Spracovanie stratégie propagačnej kampane a II. fázy implementácie v roku 2015

Zodpovedný: **OKaP**

Termín plnenia: 09/14

Dôvod: Krok F bude realizovaný po realizácii kroku E

## **Projekt č. 12 Internetová televízia BSK**

Kľúčový krok A: Spracovanie analýzy dopadu zavedenia internetovej televízie BSK

Zodpovedný: **OKaP**

Termín plnenia: 09/14

Dôvod: Vzhľadom na prebiehajúci proces tvorby internetovej televízie prepojenej s vyučovacím procesom na niektorých vybraných školách nebolo možné dostatočne kvalifikovane vypracovať analýzu dopadu zavedenia internetovej TV BSK

## **Projekt č.13 Knižná publikácia o Bratislavskom kraji**

Kľúčový krok A: Výber autora - objednávka

Zodpovedný: **OKaP**

Termín plnenia: 03/14

Dôvod: Z dôvodu presunu finančných prostriedkov bola implementácia týchto aktivít presunutá na ďalšie rozpočtové obdobie, t.j. rok 2015

Kľúčový krok B: Grafické spracovanie a zalomenie

Zodpovedný: **OKaP**

Termín plnenia: 06/14

Dôvod: Z dôvodu presunu finančných prostriedkov bola implementácia týchto aktivít presunutá na ďalšie rozpočtové obdobie, t.j. rok 2015

Kľúčový krok C: Tlač publikácie

Zodpovedný: **OKaP**

Termín plnenia: 06/14

Dôvod: Z dôvodu presunu finančných prostriedkov bola implementácia týchto aktivít presunutá na ďalšie rozpočtové obdobie, t.j. rok 2015

### **Projekt č. 14 Analýza možností komunikácie a propagácie kraja**

Kľúčový krok A: Príprava stratégie a vizuálnej koncepcie

Zodpovedný: **OKaP**

Termín plnenia: 03/14

Dôvod: Z dôvodu presunu finančných prostriedkov bola implementácia týchto aktivít presunutá na ďalšie rozpočtové obdobie, t.j. rok 2015

Kľúčový krok B: Výber agentúry verejným obstarávaním

Zodpovedný: **OKaP**

Termín plnenia: 06/14

Dôvod: Z dôvodu presunu finančných prostriedkov bola implementácia týchto aktivít presunutá na ďalšie rozpočtové obdobie, t.j. rok 2015

Kľúčový krok C: Spracovanie analýzy a nastavenie stratégie

Zodpovedný: **OKaP**

Termín plnenia: 09/14

Dôvod: Z dôvodu presunu finančných prostriedkov bola implementácia týchto aktivít presunutá na ďalšie rozpočtové obdobie, t.j. rok 2015

### **Projekt č. 15 Projekt Piknik&Bike (II. fáza)**

Kľúčový krok E: Realizácia promo P&B Cyklomost slobody

Zodpovedný: **OKaP**

Termín plnenia: 06/14

Dôvod: Z dôvodu presunu finančných prostriedkov bola implementácia týchto aktivít presunutá na ďalšie rozpočtové obdobie, t.j. rok 2015

Kľúčový krok F: Multimedialne app. P&B

Zodpovedný: **OKaP**

Termín plnenia: 03/14

Dôvod: Z dôvodu presunu finančných prostriedkov bola implementácia týchto aktivít presunutá na ďalšie rozpočtové obdobie, t.j. rok 2015

### **Projekt č. 16 Propagácia po ukončení projektu: Rekonštrukcia Bratislavského bábkového divadla**

Kľúčový krok A: Spracovanie konceptu možností propagácie BBD s cieľom zvýšiť návštevnosť divadla, ako aj zvýšiť povedomie o značke s pozitívnym dopadom na zriaďovateľa

Zodpovedný: **OKaP**

Termín plnenia: 06/14

Dôvod: Spracovanie konceptu je podmienené začiatkom samotnej rekonštrukcie, ktorá ešte nezačala

### **Projekt č. 17 Propagácia po ukončení projektu: Rekonštrukcia polikliniky Karlova Ves, Bratislava**

Kľúčový krok A: Spracovanie konceptu možností propagácie Polikliniky s cieľom zvýšiť povedomie o značke s pozitívnym dopadom na zriaďovateľa

Zodpovedný: **OKaP**

Termín plnenia: 06/14

Dôvod: Spracovanie konceptu je podmienené začiatkom samotnej rekonštrukcie, ktorá ešte nezačala

V rámci **Odboru ÚP, GIS a životného prostredia** sú definované 3 projekty, pričom k nesplneniu kľúčových krokov došlo v prípade 1 projektu.

### **Projekt č. 19 GIS – Geografický informačný systém**

Kľúčový krok A: Pasportizácia a elektronizácia súčasného stavu, uskutočnenie VO a zazmluvnenie dodávateľa, analýza nastavenia, zakúpenie SW a HW

Zodpovedný: **OÚPGISaŽP**

Termín plnenia: 12/14

Dôvod: Formou VO priamym rokovaním bol vysúťažený dodávateľ SW. Vzhľadom k tomu, že vz rozpočtu na rok 2014 nepostačovali finančné prostriedky pre tento účel a vzhľadom na skutočnosť, že sa zmenil odhad hodnôt na uvedený predmet zákazky, zmenili sa týmto aj okolnosti za ktorých bolo vyhlásené VO, v decembri 2014 bolo VO na uvedený predmet zákazky zrušené

V rámci **Odboru zdravotníctva** sú definované 3 projekty, pričom k zrušeniu kľúčových krokov došlo v prípade 1 projektu.

### **Projekt č. 22 Kompletná rekonštrukcia Polikliniky Karlova Ves**

Kľúčový krok C: Rekonštrukcia polikliniky Karlova Ves

Zodpovedný: **OIČSMaVO/OIČ/OZ**

Termín plnenia: 12/14

Dôvod:

V rámci **Odboru školstva, mládeže a športu** je definovaných 8 projektov, pričom k nesplneniu kľúčových krokov došlo v prípade 2 projektov

### **Projekt č. 30 Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií, Hlinícka 1, Bratislava**

Kľúčový krok E: Vysporiadanie majetkovoprávných vzťahov COVP

Zodpovedný: **Po/OIČSMaVO/SM**

Termín plnenia: 02/15

Dôvod: Vysoký počet vlastníkov nedovoľuje vysporiadanie majetkovoprávných vzťahov pod budovou COVP. Z tohto dôvodu bude musieť dôjsť k úprave projektu

### **Projekt č. 34 Rekonštrukcia a modernizácia športového areálu, telocvične**

Kľúčový krok B: Realizácia stavby  
Zodpovedný: **OIČSMaVO/OIČ/OŠMaŠ**

Termín plnenia: 11/14

Dôvod: Realizácia stavby je v štádiu vybraného zhotoviteľa s termínom dokončenia stavby 31.05.2015

Kľúčový krok C: Verejné obstarávanie pre zhotoviteľa stavby na Einsteinovej ulici

Zodpovedný: **OIČSMaVO/OVO/OŠMaŠ**

Termín plnenia: 06/14

Dôvod: OVO nedostalo podklady pre spracovanie súťažných podkladov. Projekt je pripravený na výber zhotoviteľa stavby

Kľúčový krok D: Realizácia stavby

Zodpovedný: **OŠMaŠ/OIČ**

Termín plnenia: 11/14

Dôvod: Krok D bude realizovaný po realizácii kroku C

V rámci **Odboru cestovného ruchu a kultúry** je definovaných 10 projektov, pričom k nesplneniu kľúčových krokov došlo v prípade 7 projektov

### **Projekt č. 38 Značenie kultúrno-turistických cieľov na území BSK – 2.etapa a 3.etapa**

Kľúčový krok A: Výber dodávateľa – 2.etapa

Zodpovedný: **OIČSMaVO/OVO**

Termín plnenia: 03/14

Dôvod: Proces VO bol zastavený z dôvodu procesnej chyby

Kľúčový krok B: Uzatvorenie zmluvy – 2.etapa

Zodpovedný: **OCRaK**

Termín plnenia: 06/14

Dôvod: Podpis zmluvy očakávaný do dvoch mesiacov od ukončenia výberu dodávateľa

Kľúčový krok C: Realizácia značenia – 2.etapa

Zodpovedný: **OCRaK**

Termín plnenia: 09/14

Dôvod: Dodanie predmetu zákazky do 18 mesiacov od podpisov zmluvy

### **Projekt č. 39 Dlhodobý pravidelný opakovaný prieskum jednodňového návštevníka BSK**

Kľúčový krok A: Nadefinovanie opisu predmetu VO

Zodpovedný: **OCRaK**

Termín plnenia: 06/14

Dôvod:

Kľúčový krok B: Vyhlásenie VO na dodávateľa

Zodpovedný: **OIČSMaVO/OVO**

Termín plnenia: 06/14

Dôvod:

Kľúčový krok C: Objednanie služby

Zodpovedný: **OCRaK**

Termín plnenia: 09/14

Dôvod: Na základe informácie Štatistického úradu SR prichádza k zmene metodiky šetrenia jednodňových návštevníkov SR

#### **Projekt č.41 Rekonštrukcia Bratislavského bábkového divadla**

Kľúčový krok A: Verejné obstarávanie dodávateľa stavby podľa zhotovenej tendrovej dokumentácie aj s právoplatným stavebným povolením

Zodpovedný: **OIČSMaVO/OVO**

Termín plnenia: 07/14

Dôvod: Finalizuje sa vyhlásenie súťaže na realizátora

Kľúčový krok B: Začatie realizácie prvej etapy

Zodpovedný: **OIČSMaVO/OIČ**

Termín plnenia: 09/14

Dôvod: Kľúčový krok B bude realizovaný po splnení predchádzajúceho kroku

#### **Projekt č.42 Rekonštrukcia kaštieľa a parku v Modre**

Kľúčový krok D: Verejné obstarávanie realizátora sanácie

Zodpovedný: **OIČSMaVO/OVO**

Termín plnenia: 09/14

Dôvod: Z dôvodu predĺženia vypracovania realizačnej PD oporného múra došlo k oneskoreniu získania PD

Kľúčový krok E: Sanácia oporného múra

Zodpovedný: **OIČSMaVO/ OIČ**

Termín plnenia: 12/14

Dôvod: Nebol vybraný zhotoviteľ stavby

#### **Projekt č. 43 Pamiatková obnova kaštieľa a parku v Stupave**

Kľúčový krok B: Verejné obstarávanie zhotoviteľa sanácie prístupového mosta

Zodpovedný: **OIČSMaVO/OVO**

Termín plnenia: 05/14

Dôvod: OVO nemá podklady pre spracovanie súťažných podkladov

Kľúčový krok C: Sanácia prístupového mosta

Zodpovedný: **OIČSMaVO/OIČ**

Termín plnenia: 08/14

Dôvod: Bola vypracovaná projektová dokumentácia

#### **Projekt č.45 Konceptia rozvoja kultúry na roky 2014 – 2020**

Kľúčový krok A: Spracovanie koncepcie rozvoja kultúry 2014 - 2020

Zodpovedný: **OCRaK**

Termín plnenia: 12/14

Dôvod: Pri komisii kultúry Z BSK bola ustanovená odborná pracovná skupina (september), ktorá pripraví pracovný návrh koncepcie

#### **Projekt č.46 Rekonštrukcia kaštieľa a parku v Malinove**

Kľúčový krok A: 2 pracovné stretnutia odbornej verejnosti, spolupráca so študentmi FA UK na tému využitia kaštieľa (prvé stretnutie priamo v kaštieli, druhé na BSK)

Zodpovedný: **OCRaK**

Termín plnenia: 10/14

Dôvod: Absencia finančných zdrojov

Kľúčový krok B: Ideový zámer využitia/ koncepcia rozvoja priestorov (s kalkuláciou nákladov, feasibility study s variantmi riešenia) v súlade s výstupmi s odborných stretnutí

Zodpovedný: **OCRaK**

Termín plnenia: 10/14

Dôvod: Prakticky neriešiteľné vzhľadom na nevyhnutný objem financií na rekonštrukciu (cca 1,5 až 2 mil. EUR)

Kľúčový krok D: Sanácia strechy

Zodpovedný: **OIČSMaVO/OIČ**

Termín plnenia: 09/14

Dôvod: Oproti pôvodnému projektu opravy strechy je nevyhnutná kompletná oprava strechy, ktorá je zahrnutá do plánu investičných činností na rok 2015

**Projekt č.48 BID – dispečing**

Kľúčový krok A: Ukončenie VO

Zodpovedný: **OSÚRaRP**

Termín plnenia: 03/14

Dôvod: V rámci procesu VO boli podané námietky zo strany uchádzačov. V súčasnosti prebieha konanie o námietka.

Kľúčový krok B: Vyhodnotenie a zazmluvnenie dodávateľa

Zodpovedný: **OSÚRaRP**

Termín plnenia: 06/14

Dôvod: Vzhľadom na vyššie uvedené nebolo možné zazmluvniť úspešného uchádzača

Kľúčový krok C: Dodávka systému a uvedenie do prevádzky

Zodpovedný: **OSÚRaRP**

Termín plnenia: 12/14

Dôvod: Z dôvodu neúspešného ukončenia kľúčového kroku A je termín dodávky systému a uvedenie do prevádzky posunutý

V rámci **Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov** je definovaných 19 projektov, pričom k nesplneniu kľúčových krokov došlo v prípade 5 projektov

**Projekt č.49 BID – promo**

Kľúčový krok B: Vyhodnotenie a zazmluvnenie dodávateľa

Zodpovedný: **OSÚRaRP**

Termín plnenia: 06/14

Dôvod: Prebieha administratívna kontrola dokumentácie procesu VO na RO OPBK, podpis zmluvy je možný až po kladnom stanovisku RO OPBK

Kľúčový krok C: Dodávka systému a uvedenie do prevádzky

Zodpovedný: **OSÚRaRP**

Termín plnenia: 12/14



Dôvod: Vzhľadom na vyššie uvedené a v súčasnosti neexistujúceho zmluvného vzťahu s úspešnými uchádzačmi nebolo možné dodať predmet obstarávania

### **Projekt č.50 Zriadenie jednotného tarifného systému BID u správcu železničnej infraštruktúry – ŽSR**

Kľúčový krok A: Dodávka a uvedenie do prevádzky

Zodpovedný: **OSÚRaRP**

Termín plnenia: 06/14

Dôvod: Počas výrobného procesu nastali skutočnosti, vzhľadom na ktoré došlo k predĺženiu dodania predmetu zmluvy.

### **Projekt č.53 Za mostom**

Kľúčový krok A: Ponuka MO SR na prevod vlastníctva objektov SĽO na BSK

Zodpovedný: **OSÚRaRP**

Termín plnenia: 04/14

Dôvod: k 31.12.2014 nebol vládou SR schválený prevod SĽO vo vlastníctve MO SR do vlastníctva BSK

### **Projekt č.60 Rekonštrukcia NKP synagógy, novostavba infopavilónu a úprava areálu synagógy v Senci za účelom zriadenia regionálnej galérie BSK a stálej expozície židovskej kultúry**

Kľúčový krok C: Verejné obstarávanie realizátora stavebných prác

Zodpovedný: **OIČSMaVO/OVO**

Termín plnenia: 10/14

Dôvod: Vzhľadom k neschváleniu žiadosti o NFP verejné obstarávanie neprebehlo

Kľúčový krok E: Spracovanie konceptu možností propagácie synagógy s cieľom zvýšiť návštevnosť galérie, ako aj zvýšiť povedomie o značke s pozitívnym dopadom na zriaďovateľa

Zodpovedný: **OKaP**

Termín plnenia: 12/14

Dôvod: Vzhľadom k neschváleniu žiadosti o NFP kľúčový krok bol pozastavený

### **Projekt č.65 Napíňanie Regionálneho akčného plánu BSK na rozvoj udržateľnej dopravy a turizmu pre podunajský región na r.2014 – 2020**

Kľúčový krok B:

Zodpovedný: **OSÚRaRP**

Termín plnenia: 12/14

Dôvod: Rokovania s aktérmi Podunajskej oblasti boli začaté v plánovanom termíne a v priebehu r.2014 boli tieto vzťahy udržiavané a upevňované na spoločných stretnutiach v rámci priebehu projektu Transdanube. Navrhujeme posun termínu písomného vyjadrenia súhlasu vo forme memoranda, nakoľko nebolo možné v pôvodnom termíne tieto vzťahy dostať do všeobecne akceptovanej zmluvnej podoby jednotlivých aktérov.

## Nové kľúčové kroky na rok 2015 - 2016

V rámci **Odboru sociálnych vecí** je definovaných 9 projektov, pričom k doplneniu kľúčových krokov implementácie došlo v prípade 2 projektov:

### **Projekt č.3 Investičná podpora zariadení sociálnych služieb na Hontianskej 12 a 16**

Kľúčový krok A: Výber zhotoviteľa stavby  
Zodpovedný: **OIČSMaVO**  
Termín plnenia: 12/15

Kľúčový krok B: Realizácia stavby  
Zodpovedný: **OIČSMaVO**  
Termín plnenia: 12/16

### **Projekt č.5 Podpora deinštitucionalizácie sociálnych služieb v okresoch Pezinok a Bratislava**

Kľúčový krok D: Vypracovať podklad pre spracovanie projektového zámeru (transformačný plán)  
Zodpovedný: **OSÚRaRP**  
Termín plnenia: 6/15

### **Projekt č.6 Program celoživotného vzdelávania zamestnancov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK**

Kľúčový krok B: Analýza možností financovania z externých zdrojov  
Zodpovedný: **OSÚRaRP**  
Termín plnenia: 06/2015

V rámci **Odboru dopravy** je definovaných 6 projektov, pričom k doplneniu kľúčových krokov implementácie došlo v prípade 2 projektov:

### **Projekt č.23 Kooperácia na rozširovaní a zachovaní ústavnej pohotovostnej služby v regióne Záhorie vo verejnom záujme**

Kľúčový krok E: Spracovanie návrhu systémového riešenia pre poskytovanie UPS pre región Záhorie  
Zodpovedný: **OZ**  
Termín plnenia: 04/15

### **Projekt č.24 Modernizácia cesty III/50310 a vybudovanie obchvatu obce Rohožník**

Kľúčový krok G: Predloženie projektového zámeru na Radu Partnerstva IROP  
Zodpovedný: **OSÚRaRP**  
Termín plnenia: 04/15

Kľúčový krok F: Vydané platné stavebné povolenie  
Zodpovedný: **OD/OÚPGISaŽP**  
Termín plnenia: 04/16

Kľúčový krok H: Vyhlásenie súťaže na zhotoviteľa Tendrovej dokumentácie  
Zodpovedný: **OIČSMaVO/OVO**  
Termín plnenia: 04/16

Kľúčový krok I: Vysúťažený zhotoviteľ Tendrovej dokumentácie  
Zodpovedný: **OIČSMaVO/OVO**  
Termín plnenia: 07/16

Kľúčový krok J: Vypracovanie Tendrovej dokumentácie  
Zodpovedný: **Dodávateľ – dozoruje OD/OSÚRaRP**  
Termín plnenia: 10/16

Kľúčový krok K: Predloženie projektu, Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku  
Zodpovedný: **OSÚRaRP**  
Termín plnenia: 11/16

Kľúčový krok L: Príprava súťažných podkladov na VO na zhotoviteľa stavby  
Zodpovedný: **OIČSMaVO/OVO/OD/OSÚRaRP**  
Termín plnenia: 12/16

#### **Projekt č.25 Vybudovanie obchvatu Pezinok – Modra**

Kľúčový krok C: Vyhlásenie súťaže na zhotoviteľa DUR  
Zodpovedný: **OIČSMaVO/OVO/OD**  
Termín plnenia: 07/15

Kľúčový krok D: Vysúťažený zhotoviteľ DUR (vrátane zamerania stavby)  
Zodpovedný: **OIČSMaVO/OVO**  
Termín plnenia: 12/15

V rámci **Odboru školstva mládeže a športu** je definovaných 8 projektov, pričom k doplneniu nových kľúčových krokov implementácie došlo v prípade projektov:

#### **Projekt č. 30. Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií, Hlinícka 1, Bratislava**

Kľúčový krok D: Vyhlásenie rámcovej súťaže VO na zhotoviteľa vytvorenia projektových dokumentácií v stupni

Zodpovedný: **OIČSMaVO/OVO/OIČ/OŠMaŠ/OSÚRaRP**

Termín plnenia: 01/15

Kľúčový krok F: Podpis zmluvy s úspešným uchádzačom/uchádzačmi na zhotoviteľa vytvorenia projektových dokumentácií v stupni tendrovej dokumentácie + inžiniering

Zodpovedný: **OIČSMaVO /OVO/OIČ/PO/OSÚRaRP**

Termín plnenia: 06/15

Kľúčový krok G: Vytvorenie projektovej dokumentácie  
Zodpovedný: **Dodávateľ/ OIČSMaVO/OIČ/OSÚRaRP**  
Termín plnenia: 10/15

Kľúčový krok H: Predloženie projektového zámeru na Radu Partnerstva IROP  
Zodpovedný: **OSÚRaRP**  
Termín plnenia: 01/16

Kľúčový krok I: Inžiniering a získanie stavebného povolenia  
Zodpovedný: **Dodávateľ/ OIČSMaVO/OIČ/OSÚRaRP**  
Termín plnenia: 12/15

Kľúčový krok J: Doriešenie náhradnej výučby pre COVP od školského roku 2016/2017  
Zodpovedný: **OIČSMaVO/ OIČ/SM/Školy**  
Termín plnenia: 12/15

**Projekt č. 31. Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy v pekárstve a cukrárstve a v mäsiarstve a lahôdkarstve, Farského 9, Bratislava**

Kľúčový krok D: Vyhlásenie rámcovej súťaže VO na zhotoviteľa vytvorenia projektových dokumentácií v stupni  
Zodpovedný: **OIČSMaVO/OVO/OIČ/OŠMaŠ/OSÚRaRP**  
Termín plnenia: 01/15

Kľúčový krok F: Podpis zmluvy s úspešným uchádzačom/uchádzačmi na zhotoviteľa vytvorenia projektových dokumentácií v stupni tendrovej dokumentácie + inžiniering  
Zodpovedný: **OIČSMaVO /OVO/OIČ/PO/OSÚRaRP**  
Termín plnenia: 06/15

Kľúčový krok G: Vytvorenie projektovej dokumentácie  
Zodpovedný: **Dodávateľ/ OIČSMaVO/OIČ/OSÚRaRP**  
Termín plnenia: 10/15

Kľúčový krok H: Predloženie projektového zámeru na Radu Partnerstva IROP  
Zodpovedný: **OSÚRaRP**  
Termín plnenia: 01/16

Kľúčový krok I: Inžiniering a získanie stavebného povolenia  
Zodpovedný: **Dodávateľ/ OIČSMaVO/OIČ/OSÚRaRP**  
Termín plnenia: 12/15

Kľúčový krok J: Doriešenie náhradnej výučby pre COVP od školského roku 2016/2017  
Zodpovedný: **OIČSMaVO/ OIČ/SM/Školy**  
Termín plnenia: 12/15

**Projekt č. 32. Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy agropodnikaní - farmárstve, v chove koní a jazdectve, v kynológii a v rybárstve, SNP 30, Ivanka pri Dunaji**

Kľúčový krok F: Vyhlásenie rámcovej súťaže VO na zhotoviteľa vytvorenia projektových dokumentácií v stupni

Zodpovedný: **OIČSMaVO/OVO/OIČ/OŠMaŠ/OSÚRaRP**

Termín plnenia: 01/15

Kľúčový krok H: Podpis zmluvy s úspešným uchádzačom/uchádzačmi na zhotoviteľa vytvorenia projektových dokumentácií v stupni tendrovej dokumentácie + inžiniering

Zodpovedný: **OIČSMaVO /OVO/OIČ/PO/OSÚRaRP**

Termín plnenia: 06/15

Kľúčový krok I: Vytvorenie projektovej dokumentácie

Zodpovedný: **Dodávateľ/ OIČSMaVO/OIČ/OSÚRaRP**

Termín plnenia: 10/15

Kľúčový krok J: Predloženie projektového zámeru na Radu Partnerstva IROP

Zodpovedný: **OSÚRaRP**

Termín plnenia: 01/16

Kľúčový krok K: Inžiniering a získanie stavebného povolenia

Zodpovedný: **Dodávateľ/ OIČSMaVO/OIČ/OSÚRaRP**

Termín plnenia: 12/15

Kľúčový krok L: Doriešenie náhradnej výučby pre COVP od školského roku 2016/2017

Zodpovedný: **OIČSMaVO/ OIČ/SM/Školy**

Termín plnenia: 12/15

**Projekt č. 33. Vytvorenie a rekonštrukcia strednej odbornej školy Ivanská cesta 21 na Centrum odborného vzdelávania a prípravy v stavebníctve**

Kľúčový krok E: Vyhlásenie rámcovej súťaže VO na zhotoviteľa vytvorenia projektových dokumentácií v stupni

Zodpovedný: **OIČSMaVO/OVO/OIČ/OŠMaŠ/OSÚRaRP**

Termín plnenia: 01/15

Kľúčový krok G: Podpis zmluvy s úspešným uchádzačom/uchádzačmi na zhotoviteľa vytvorenia projektových dokumentácií v stupni tendrovej dokumentácie + inžiniering

Zodpovedný: **OIČSMaVO /OVO/OIČ/PO/OSÚRaRP**

Termín plnenia: 06/15

Kľúčový krok H: Vytvorenie projektovej dokumentácie

Zodpovedný: **Dodávateľ/ OIČSMaVO/OIČ/OSÚRaRP**

Termín plnenia: 10/15

Kľúčový krok I: Predloženie projektového zámeru na Radu Partnerstva IROP

Zodpovedný: **OSÚRaRP**  
Termín plnenia: 01/16

Kľúčový krok J: Inžiniering a získanie stavebného povolenia  
Zodpovedný: **Dodávateľ/ OIČSMaVO/OIČ/OSÚRaRP**  
Termín plnenia: 12/15

Kľúčový krok K: Doriešenie náhradnej výučby pre COVP od školského roku 2016/2017  
Zodpovedný: **OIČSMaVO/ OIČ/SM/Školy**  
Termín plnenia: 12/15

### **Projekt č. 35 Certifikát BSK - kvalitná škola**

Kľúčový krok B: Analýza možností financovania aktivity „Certifikát BSK“ z externých zdrojov  
Zodpovedný: **OSÚRaRP**  
Termín plnenia: 09/15

V prípade ostatých odborov nedošlo k pridaniu nových kľúčových krokov.

## **Návrhy na zrušenie projektov**

Okrem zmien a doplnení Akčného plánu BSK z dôvodu objektívnych príčin došlo k návrhu na zrušenie nasledovných projektov:

### **Projekt č. 7 Hodnotenie kvality sociálnych služieb v kompetencii BSK a monitorovanie ich plnenia**

Zodpovedný: OSV

Zdôvodnenie: Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov v paragrafe 104, odseku 4 ustanovil Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, aby hodnotil podmienky kvality sociálnej služby prostredníctvom poverených štátnych zamestnancov. Kompetenciu hodnotiť kvalitu poskytovanej sociálnej služby má teda výlučne Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

### **Projekt č. 26 Obmedzenie tranzitu ťažkej nákladnej dopravy**

Zodpovedný: OD

Zdôvodnenie: Vzhľadom na obmedzenie tranzitu ťažkej nákladnej dopravy ktoré priamo vyplýva zo zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona **144/2010** Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (plošný zákaz pohybu vozidiel ťažších ako 12 ton po cestách III. triedy) je požadované zrušenie tohto bodu z dôvodu irelevantnosti.

### **Projekt č.27 Zriadenie cyklotrás vo vojenskom obvode Záhorie a v Malých Karpatoch**

Zodpovedný: OD

Zdôvodnenie: Plánované cyklotrasy cez Vojenský obvod Záhorie sa nerealizovali z dôvodu, že Ministerstvo obrany SR si vyčlenilo hodiny na cvičenia a streľby v danom území, a pre občanov by jazda na bicykli bola v danom vojenskom priestore životu nebezpečná.

Pôvodný návrh, aby sa dalo jazdiť na bicykli vo Vojenskom obvode Záhorie len cez víkendy, už nie je z daného dôvodu reálny, preto je navrhované zrušenie tohto projektu

### **Technické zmeny Akčného plánu BSK**

Projekt č. 60 Rekonštrukcia NKP synagógy, novostavba infopavilónu a úprava areálu synagógy v Senci za účelom zriadenia regionálnej galérie BSK a stálej expozície židovskej kultúry sa presunul pod Odbor cestovného ruchu a kultúry.

Mení sa číslovanie projektov, pričom projekty Odboru sociálnych vecí pôvodne číslované projekty 1 až 10 budú číslované ako OSV\_1 až OSV\_9, projekty Odboru komunikácie a propagácie pôvodne číslované ako 11 až 17 ako OKaP\_1 až OKaP\_7, projekty Odboru územného plánu, GIS a životného prostredia pôvodne číslované ako 18 až 20 ako OÚPGISaŽP\_1 a OÚPGISaŽP\_3, projekty Odboru zdravotníctva pôvodne číslované ako 21 až 23 ako OZ\_1 až OZ\_3, projekty Odboru dopravy pôvodne číslované ako 24 až 29 ako OD\_1 až OD\_6, projekty Odboru školstva, mládeže a športu pôvodne číslované ako 30 až 37 ako OŠMaŠ\_1 až OŠMaŠ\_8, projekty Odboru cestovného ruchu a kultúry pôvodne číslované ako 38 až 47 ako OCRaK\_1 až OCRaK\_10, projekty Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov pôvodne číslované ako 48 až 66 ako OSÚRaRP\_1 až OSÚRaRP\_19.

Počet projektov ostáva nezmenený, avšak hore vysvetleným prečíslovaním sme odstránili pôvodnú chybu v číslovaní, kedy v Akčnom pláne neexistoval projekt č. 9.

### **Prílohy:**

**Príloha č. 1:** Odpočet Akčného plánu Úradu BSK pre implementáciu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014-2020 (ďalej len Odpočet Akčného plánu BSK) za kalendárny rok 2014

**Príloha č. 2:** Aktualizovaný Akčný plánu Úradu BSK pre implementáciu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014-2020 (ďalej len Aktualizácia Akčného plánu BSK) pre kalendárny rok 2015.

## Stanoviská komisií Zastupiteľstva BSK

„Plnenie Akčného plánu Úradu BSK pre implementáciu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014-2020“

Názov komisie	Stanovisko komisie k návrhu materiálu	Hlasovanie	Akceptované / Neakceptované	Zapracované / Nezapracované
Mandátová komisia	-	-	-	-
Komisia na ochranu verejného záujmu	-	-	-	-
Finančná komisia	Návrh pani Zemanovej na doplnenie uznesenia v bode B.: <b>ukladá riaditeľovi Úradu BSK</b> , aby dohliadal na plnenie termínov a realizácie Akčného plánu.	Prítomní 6 Za 5 Proti 0 Zdržal sa hlasovania 1 Nehlasoval 0	Neakceptované	Nezapracované vzhľadom na pravidelné informovanie riaditeľa Ú BSK o plnení AP a každoročné informovanie Z BSK. o uvedených aktivitách.
	Finančná komisia po prerokovaní materiálu <b>odporúča Z BSK schváliť</b> „Plnenie Akčného plánu Úradu BSK pre implementáciu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014-2020“ s doplneným uznesenia podľa návrhu Finančnej komisie.	Prítomní 6 Za 6 Proti 0 Zdržal sa hlasovania 0 Nehlasoval 0	-	-
Komisia majetku, investícií a verejného obstarávania	Komisia majetku, investícií a verejného obstarávania po prerokovaní materiálu odporúča tento predložiť na rokovanie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a schváliť predložený návrh.	Prítomní 3 Za 3 Proti 0 Zdržal sa hlasovania 0 Nehlasoval 0	-	-
Komisia dopravy	KD po prerokovaní materiálu hlasovala za návrh doplnenia navrhnutého uznesenia v bode B2 pani poslankyne Zemanovej <b>„B2 riaditeľovi úradu</b>	Prítomní 11 Za 11 Proti 0	Neakceptované	Nezapracované vzhľadom na pravidelné



	<p><b>realizovať opatrenia s napĺňaním a realizovaním Akčného plánu podľa schváleného plánu v schválených termínoch“.</b></p> <p><b>KD po prerokovaní odporúča Z BSK prerokovať a schváliť predložený materiál a v zmysle doplnených návrhov návrhu uznesenia.</b></p>	Zdržal sa hlasovania 0 Nehlasoval 0		informovanie riaditeľa Ú BSK o plnení AP a každoročné informovanie Z BSK o uvedených aktivitách.
Komisia európskych záležitostí, regionálnej spolupráce a cestovného ruchu	<b>Komisia európskych záležitostí, regionálnej spolupráce a cestovného ruchu odporúča Z BSK prerokovať a schváliť predložený materiál.</b>	Prítomní 6 Za 6 Proti 0 Zdržal sa hlasovania 0 Nehlasoval 0	-	-
Komisia kultúry	Komisia kultúry po prerokovaní predložený materiál schvaľuje a odporúča Z BSK predložený materiál prerokovať a prijať navrhované uznesenie.	Prítomní 7 Za 7 Proti 0 Zdržal sa hlasovania 0 Nehlasoval 0	-	-
Komisia školstva, mládeže a športu	Komisia materiál prerokovala a: - v súvislosti s Centrom odborného vzdelávania a prípravy na SOŠ informačných technológií na Hliníkovej 1 v Bratislave žiada riaditeľa úradu o zabezpečenie majetkovo-právnej analýzy územia a návrhov riešenia prostredníctvom právneho oddelenia - odporúča v zmysle návrhu uznesenia predložiť na rokovanie Zastupiteľstva BSK	Prítomní 7 Za 7 Proti 0 Zdržal sa hlasovania 0 Nehlasoval 0	-	-
Komisia zdravotníctva a sociálnych vecí	Členovia KZaSV po prerokovaní materiálu odporúčajú materiál predložiť na rokovanie Z BSK a schváliť s pripomienkami: v projekte č. 3, v zdôvodnení, v prvej vete slovo „alebo“ nahradiť spojku „a“, v projekte č. 23 odbor zdravotníctva preformuluje kľúčové kroky A,B a preverí názov projektu a zosúladí s uznesením Zastupiteľstva BSK k príslušnému materiálu z 24.10.2014, v časti „stav“ uvedie „zrušiť“.	Prítomní 8 Za 8 Proti 0 Zdržal sa hlasovania 0 Nehlasoval 0	Akceptované	Zapracované

Komisia dotačná	-	-	-	-
Komisia regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia	Komisia po prerokovaní materiálu <b><u>odporúča Z BSK predložený návrh uznesenia schváliť.</u></b>	Prítomní 7 Za 7 Proti 0 Zdržal sa hlasovania 0 Nehlasoval 0	-	-
Komisia Samuela Zocha	-	-	-	-

V stĺpci **zapracované / nezapracované pripomienky** uviesť či boli / neboli zapracované, ak nie, uviesť dôvod.
